



第3号 令和2年9月発行

かわら版

唐津市新庁舎建設工事

《発行元》

唐津市 総務部

新庁舎建設室

電話：0955-72-9113

唐津市役所新庁舎建設工事の進捗状況や今後の予定などについてお知らせします。工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事の進捗状況】

新庁舎では、地震の揺れを土台から回避し、建物に地震の揺れを直接伝えない免震構造を採用しています。免震装置を設置するため、建物全体の地面を約5mの深さまで掘り下げますが、周辺の土砂崩壊や地下水の流入を防ぐための、土留連壁設置工事が、9月16日から始まりました。



先端にドリルを付けた重機で、地中に穴を掘りながら、セメントミルクを注入して攪拌し、地中の土を固めます。地中に柱状の連続壁を立てるイメージです。

等間隔でH鋼を埋め込み、土留連壁の強度を高めます。



【工事スケジュール（9月～11月）】

令和2年度	9月			10月			11月		
	10日	20日	30日	10日	20日	31日	10日	20日	30日
土留連壁	←—————→								
杭工事							←————— 12月下旬まで		

- **杭工事とは：**基礎工事の一つで、杭は建物を支えるうえで重要な役割を果たします。最初に杭を入れるための穴を掘り、そこに杭を固定するためのセメントを注入し、杭を埋設していきます。長さ約10～14mの外殻鋼管付コンクリート杭128セットを、約15～19mの深さにある支持層に定着させることで、新庁舎を強固に支えます。

【お知らせ】

新庁舎建設工事にかかる先行設備工事の完了に伴い、本庁舎当直室前から西別館までの通路を開放しています。
 ただし、正面玄関前から西別館までの区間については、通路幅が狭くなっておりますので、歩行者専用通路とし、バイク・自転車などでの通行はできません。
 事故防止のため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

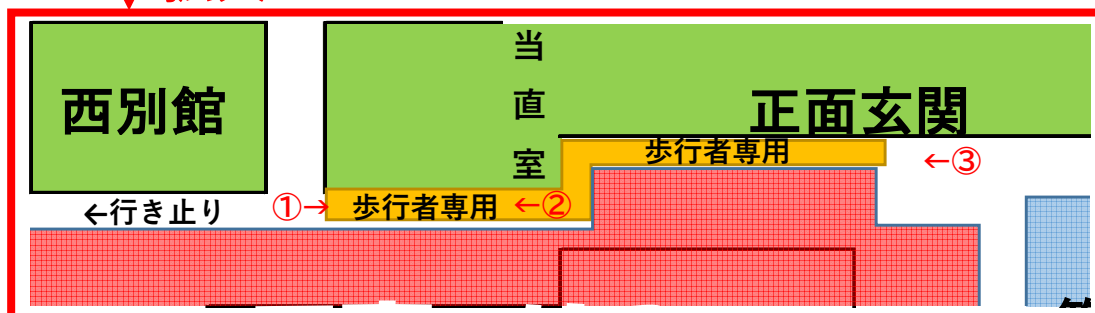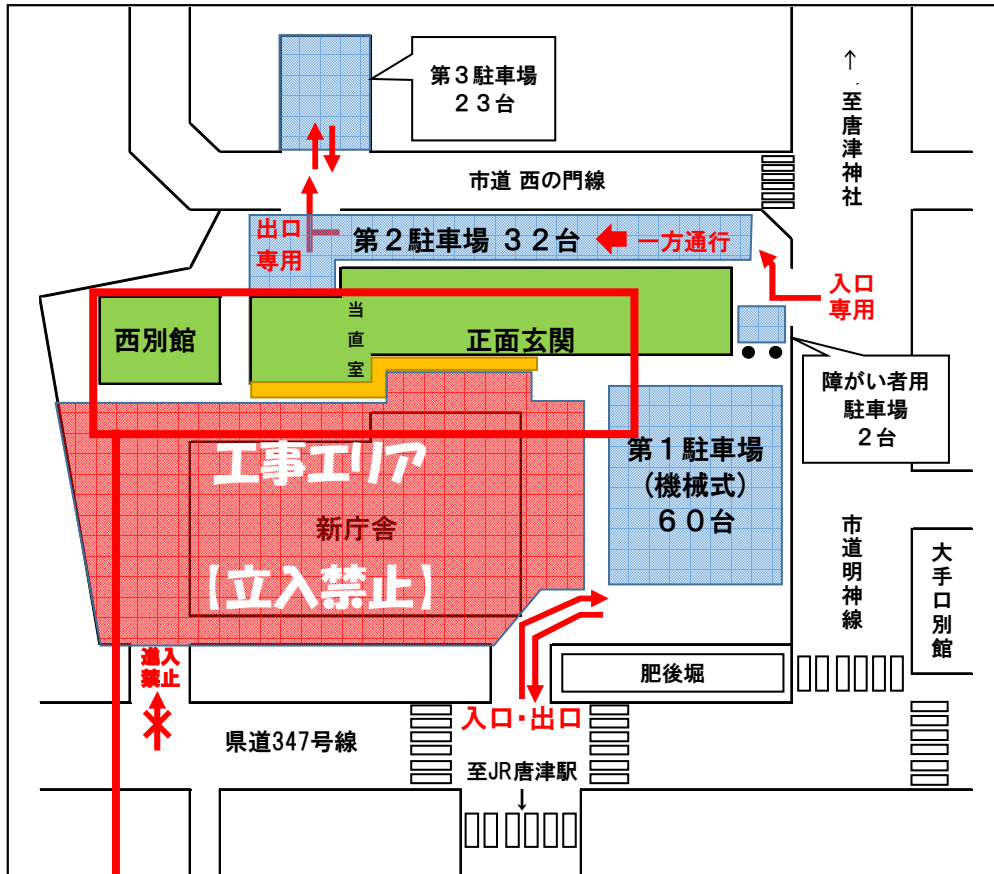

①高齢者支援課前

②当直室前

③正面玄関前

