



第5号 令和2年11月発行

# かわら版

## 唐津市新庁舎建設工事

《発行元》

唐津市 総務部

新庁舎建設室

電話：0955-72-9113

唐津市役所新庁舎建設工事の進捗状況や今後の予定などについてお知らせします。工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。


### 【工事の進捗状況】

今月から杭工事が始まりました。2台の大型重機で約30日かけて、鉄板で補強されたコンクリート杭を128セット埋設します。

巨大なドリルで、セメントミルクを注入しながら、杭を入れるための穴を掘っています。



杭を埋設しています。

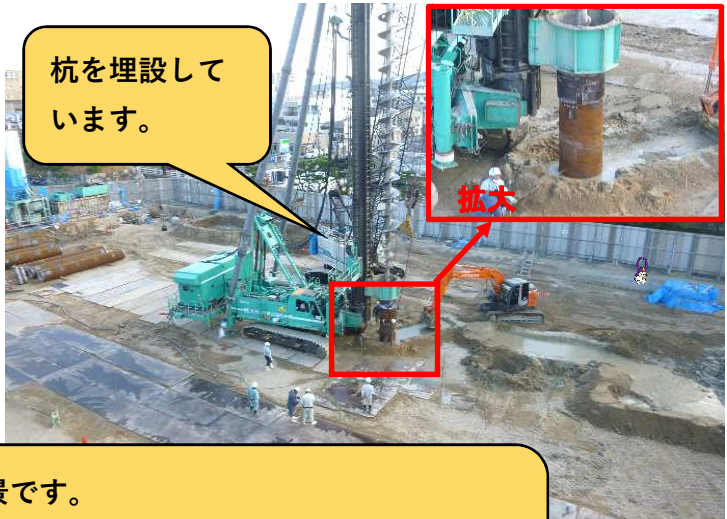

杭の全景です。  
長さは約10m～14m、  
太さは直径約90cmと100cmの2種類です。

### 【工事スケジュール（11月～1月）】

令和2年度	11月			12月			1月		
	10日	20日	30日	10日	20日	31日	10日	20日	31日
杭工事	←————→								
掘削				←————→					
							2月初旬まで		

### 【週間予定を掲示しています】

唐津市役所本庁舎正面駐車場入口付近に、工事の週間予定を掲示しています。ご来庁の際には、是非ご確認ください。



今後も安全を最優先に工事を進めていきます！

