



第9号 令和3年3月発行

かわら版

唐津市新庁舎建設工事

《発行元》

唐津市 総務部


新庁舎建設室

電話：0955-72-9113

唐津市役所新庁舎建設工事の進捗状況や今後の予定などについてお知らせします。工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事の進捗状況】

先月に引き続き、免震装置を設置するための土台をつくる基礎工事を行っています。工事は当初計画どおり令和4年5月の竣工を目指し、順調に進捗しています。

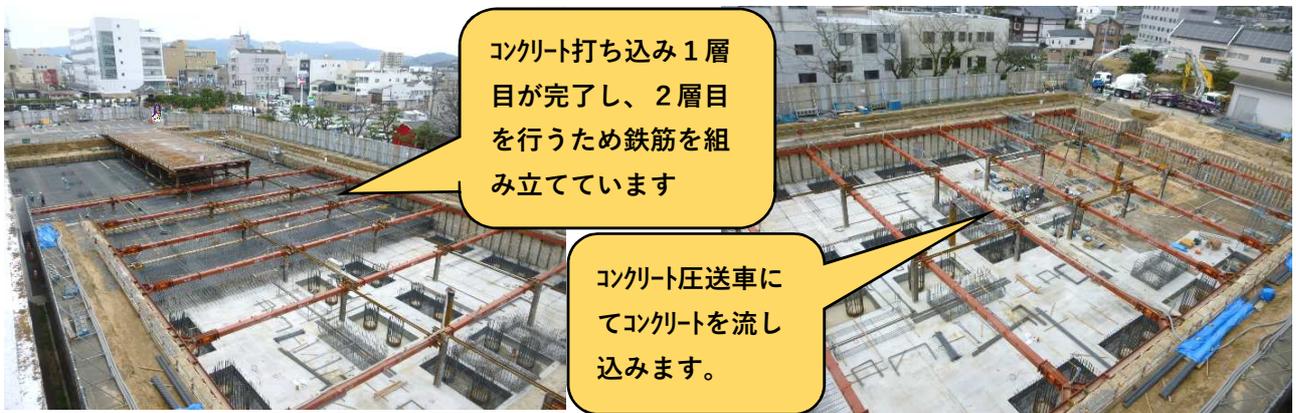

【工事スケジュール（3月～5月）】

現在行っている基礎工事は、4月末までに完了する予定です。基礎工事の進捗にあわせ、4月から免震装置の設置工事を行う予定です。

引き続きダンプや生コン車など大型の工事車両の出入りが増えますが、出入口に誘導員を配置し、安全を第一に行いますので、ご理解ご協力をお願いします。

令和2～3年度	3月			4月			5月		
	10日	20日	28日	10日	20日	31日	10日	20日	30日
基礎・免震ピット	→								
免震装置	←								
鉄骨工事	← 9月まで								

- **基礎・免震ピットとは**
免震装置を据え付ける地下の基礎や擁壁を造ります。
- **免震装置とは**
地震の時に揺れを吸収し、建物に揺れが伝わりにくくする装置を据え付けます。
新庁舎では、3種類の免震装置を66台設置します。
- **鉄骨工事とは**
鋼鉄製の部材で柱や梁など建物の骨組みをつくる工事です。



免震装置のイメージ



免震装置が地震の揺れを吸収するよ！
