



第19号 令和4年1月発行

# かわら版

## 唐津市新庁舎建設工事

《発行元》

唐津市 総務部


新庁舎建設室

電話：0955-72-9113

唐津市役所新庁舎建設工事の進捗状況や今後の予定などについてお知らせします。工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

### 【工事の進捗状況】

外壁工事を行いながら、内部では電気・通信・空調・給排水関係の配管工事とともに、内装工事が進んでいます。早いところでは、柱の壁や天井ボードの設置が完了しています

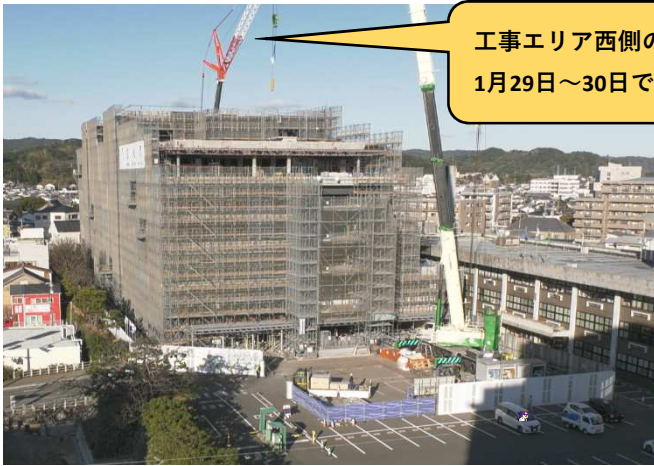

工事エリア西側の大型クレーンは  
1月29日～30日で解体します。



### 【工事スケジュール（1月～3月）】

引き続き外壁工事を行いながら、建物内部では内装の仕上げや設備工事を行っていきます。来月からは、照明器具や通信機器などの設備関係器具の取り付けが始まります。

令和3年度	1月			2月			3月		
	10日	20日	末日	10日	20日	末日	10日	20日	末日
外壁工事	9月から →								
各階本体建築・設備	9月下旬から → 4月まで								

### 【1月29日～30日は本庁舎正面東側機械式駐車場を閉鎖します】

新庁舎建設工事にかかるクレーン解体作業のため、1月29日(土)午後6時から1月30日(日)正午まで、正面東側機械式駐車場を閉鎖します。閉鎖期間中は、本庁舎北側の第2・第3駐車場を開放します。来庁される場合は、そちらを利用してください。

### 【1月30日～3月12日は本庁舎正面東側機械式駐車場が減少します】

新庁舎建設工事に伴う設備機器の荷揚げのため、工事エリアを拡張します。工事エリアの拡張に伴い、正面東側機械式駐車場の利用台数が60台から46台に減少します。

皆さんにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
